

## 谷沢川分水路工事の進捗状況等について（その2）

都が整備を進めている谷沢川分水路工事の進捗状況等についてお知らせします。


### 1. 進捗状況

令和6年1月に当ホームページにてお伝えしていた、シールドマシンの部品を交換する作業が完了し、再掘進の準備が整いましたので、3月1日に掘進を再開いたします。

### 2. 今後について

掘進の再開に当たっては、施工管理を徹底し、安全に十分配慮して施工いたします。工事の進捗状況や日々の地表面の変化については、引き続き、【谷沢川分水路工事ホームページ】にて皆様へお知らせしてまいります。

また、シールド部品の交換作業に時間を要したため、谷沢川分水路の完成時期が令和6年度から令和8年度に変更となる見込みです。事業に遅れが生じ、皆様には大変ご迷惑をおかけしますことを、お詫び申し上げます。今後も早期の完成に向けて取り組んでまいります。

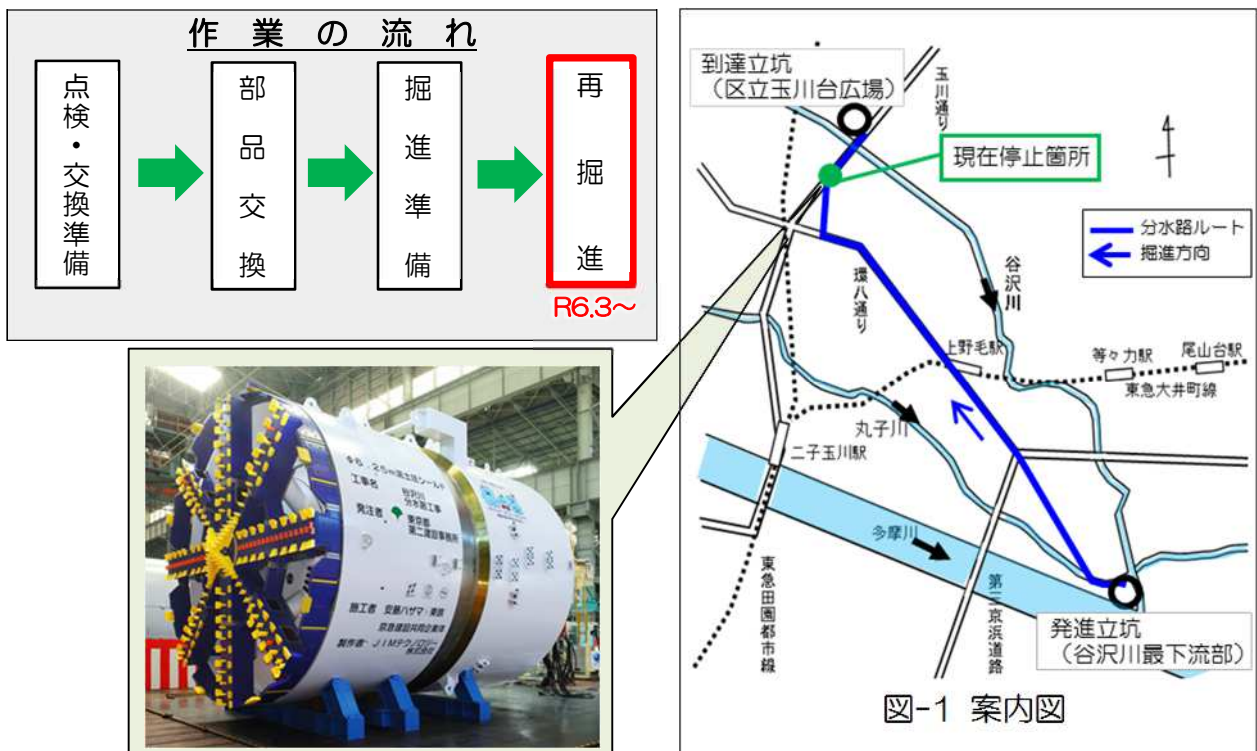

#### 《事業に関する問い合わせ先》

- ◆東京都第二建設事務所 工事第二課 谷沢川分水路工事担当  
電話 03-3774-0397
- ◆東京都第二建設事務所のホームページ  
<https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/jimusho/niken/kasen-seibi.html>
- ◆谷沢川分水路工事ホームページ  
<https://ad-hzm.jp/yazawagawa/>
